

パイプ組みの練習/6/26(土)11:00~19:45(休憩無し)

小雨決行(台風が大変そうだったら中止。多分土曜は大丈夫)

予定：運び込み⇒素舞台設置⇒パイプ組み(メイン)

⇒暗幕,吊り込み2種(時間が許す限り),照明配線(ミニ)⇒バラシ,しまい込み

※「パンチ」、「パネルの設置」は諸々の都合上カットします。

暗幕～の時間は前後の兼ね合いでパイプやバラシの時間になるかもです。

20,21がパイプ組みを経験せず19引退公演を迎えるのはきついと思ったので、

これを機にパイプ組みやその他に一回触れておこうと企画しました。

人少なくて時間きついかもしれませんが、パイプを組めたら成功です○

以下、

①運び込み(&しまい込み)リスト

②タイスケ

③素舞台・パイプ設計図

優先①

部室	個数	確認
体温計・手拭き・アルコール	1袋	
救急箱	1	
軍手	1箱	
折れ釘入れ	1	
電動ドリル	3	
工具箱	1	
アル助	3	
差金	3	
メジャー	2	
水平さん	1箱	
ラチェット	1箱	
のこぎり	1冊	
はさみ	あるだけ	
カッター	あるだけ	
油性マジック	1ケース	
黒ガム	3くらい	
養生	5くらい	
釘	1箱	
ビス(52,65,75)	1箱ずつ	
ゴミ袋	あるだけ	
カーテンフック	1袋	
クリップ	1袋	
ヘルメット	一箱	
ドライバー	1缶	
ペンチ	一箱	
DF(可：01 02 07 09 06 11 03 05)	4個	
照明ピューター	1個？	
変換	1袋	
平行延長	1袋	
座布団(灯体運搬用)	必要量	
暗幕	1"枚"※1	
番線	1袋	
ハンガー(鉄)	1箱	
掃除機※2	一個	

優先②

優先③

中庭倉庫(順番あり)	個数	確認
端	2	
A	7	
平台(90×180)	8	
平台(90×90)	2	
片足	6	
前	2	
その他90×180※3	3	
クランプ(固定)	あるだけ	
パイプ(3)	12	
パイプ(3.3)	8	
パイプ(4)	4	

103倉庫	個数	確認
脚立(長いのから)	4	
パイプ(5.5)	3	
パイプ(6)	4	
ジャッキ	10	

ピューターは手運び

※1 カーテンフックがついてるやつ

※2 しまい込みの帰りに持ってくる

※3 その場で脚を取って平台に

←まだ部室(6/23現在)

←まだ部室

←新部室

←まだ部室

←まだ部室

←まだ部室

※中庭からは素舞台 1 段目→2 段目→その他の順に運んでください

1 段目

中庭倉庫	個数	確認
端	2	
A	7	
平台(90×180)	8	
平台(90×90)	0	
片足	0	
前	0	
その他90×180※ 2	0	

2 段目

中庭倉庫	個数	確認
端	0	
A	0	
平台(90×180)	0	
平台(90×90)	2	
片足	6	
前	2	
その他90×180※ 2	3	

その他

中庭倉庫	個数	確認
クランプ	あるだけ	
パイプ(3)	12	
パイプ(3.3)	8	
パイプ(4)	4	

	アンワル	渡辺	藤居	相田	池上	三浦	堂後	小磯	芹澤	ロッキー					
~11:00(体調確認！)	新部室集合(テンキー)		W521集合			103集合(テンキー)									
11:00~	部室運び込み		中庭運び込み			103運び込み(脚立1人パイプ2人)									
11:30~															
12:00~						中庭運び込み		素舞台・パンチ							
12:30~															
13:00~						パイプ (部室運び込みの優先②が終わってなかった場合、空いた20or21が運ぶ)		素舞台・パンチ							
13:30~															
14:00~															
14:30~															
15:00~															
15:30~	結線？(⇒〃)	暗幕、吊り込み(パイプ長引いたら予備時間)						暗幕…			暗幕…				
16:00~	無し？														
16:30~	バラシ	バラシ						バラシ				バラシ			
17:00~															
17:30~															
18:00~															
18:30~															
19:00~															
19:30~20:00 (19:45W521撤退)															


※W521は10:40からの予約です。新部室、103が分からない場合連絡してW521に！

※部室運び込みは優先①が終わっていれば、12:00以降中庭運び込みに参加

…時間が微妙な時、優先②の中でも先に新部室にあるものを運び出しておくとか○

|

真ん中

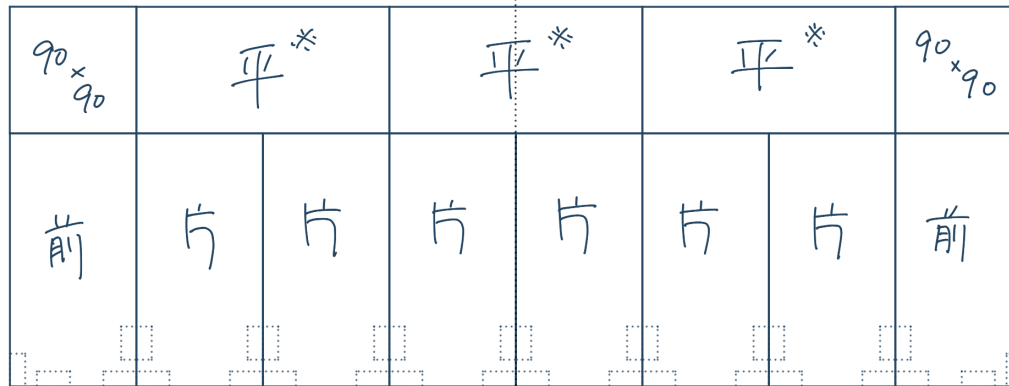

平, 片, 前 ... ぜんぶ 180x90

{ "平" ... 足なし
"片" と "前" ... 足がちょっとちがう




3本の足がある

っていう似たヤリがあるのに注意。

平* ... 倉庫にある余りな足つぎ平台を
W521で取って使います。
(釘板)

上
下

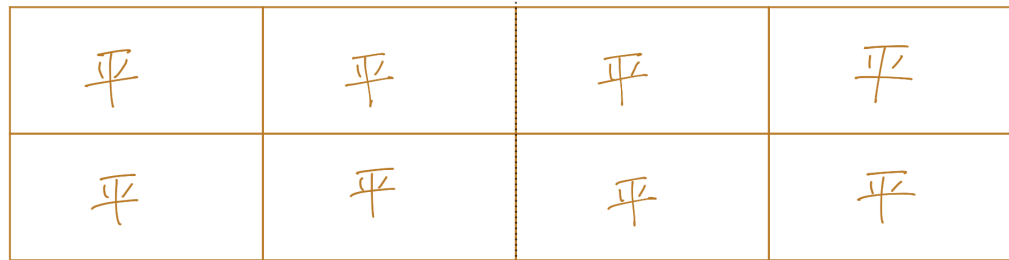

端 ... 飛びだす




A ... まったく飛びださない

(横図)




上と下を重ねる

x ... ビス打ち

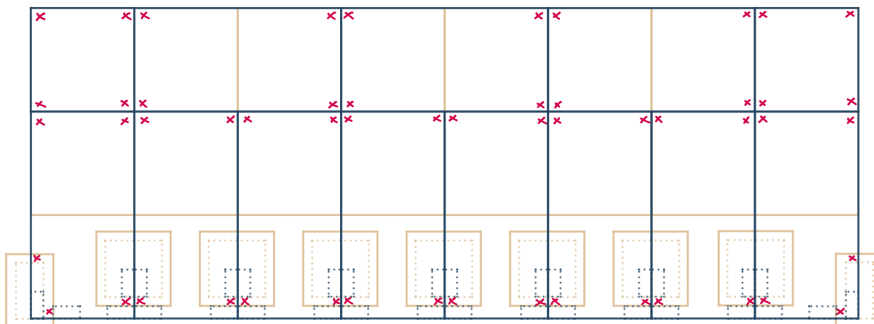

クランプ

42?? は必須

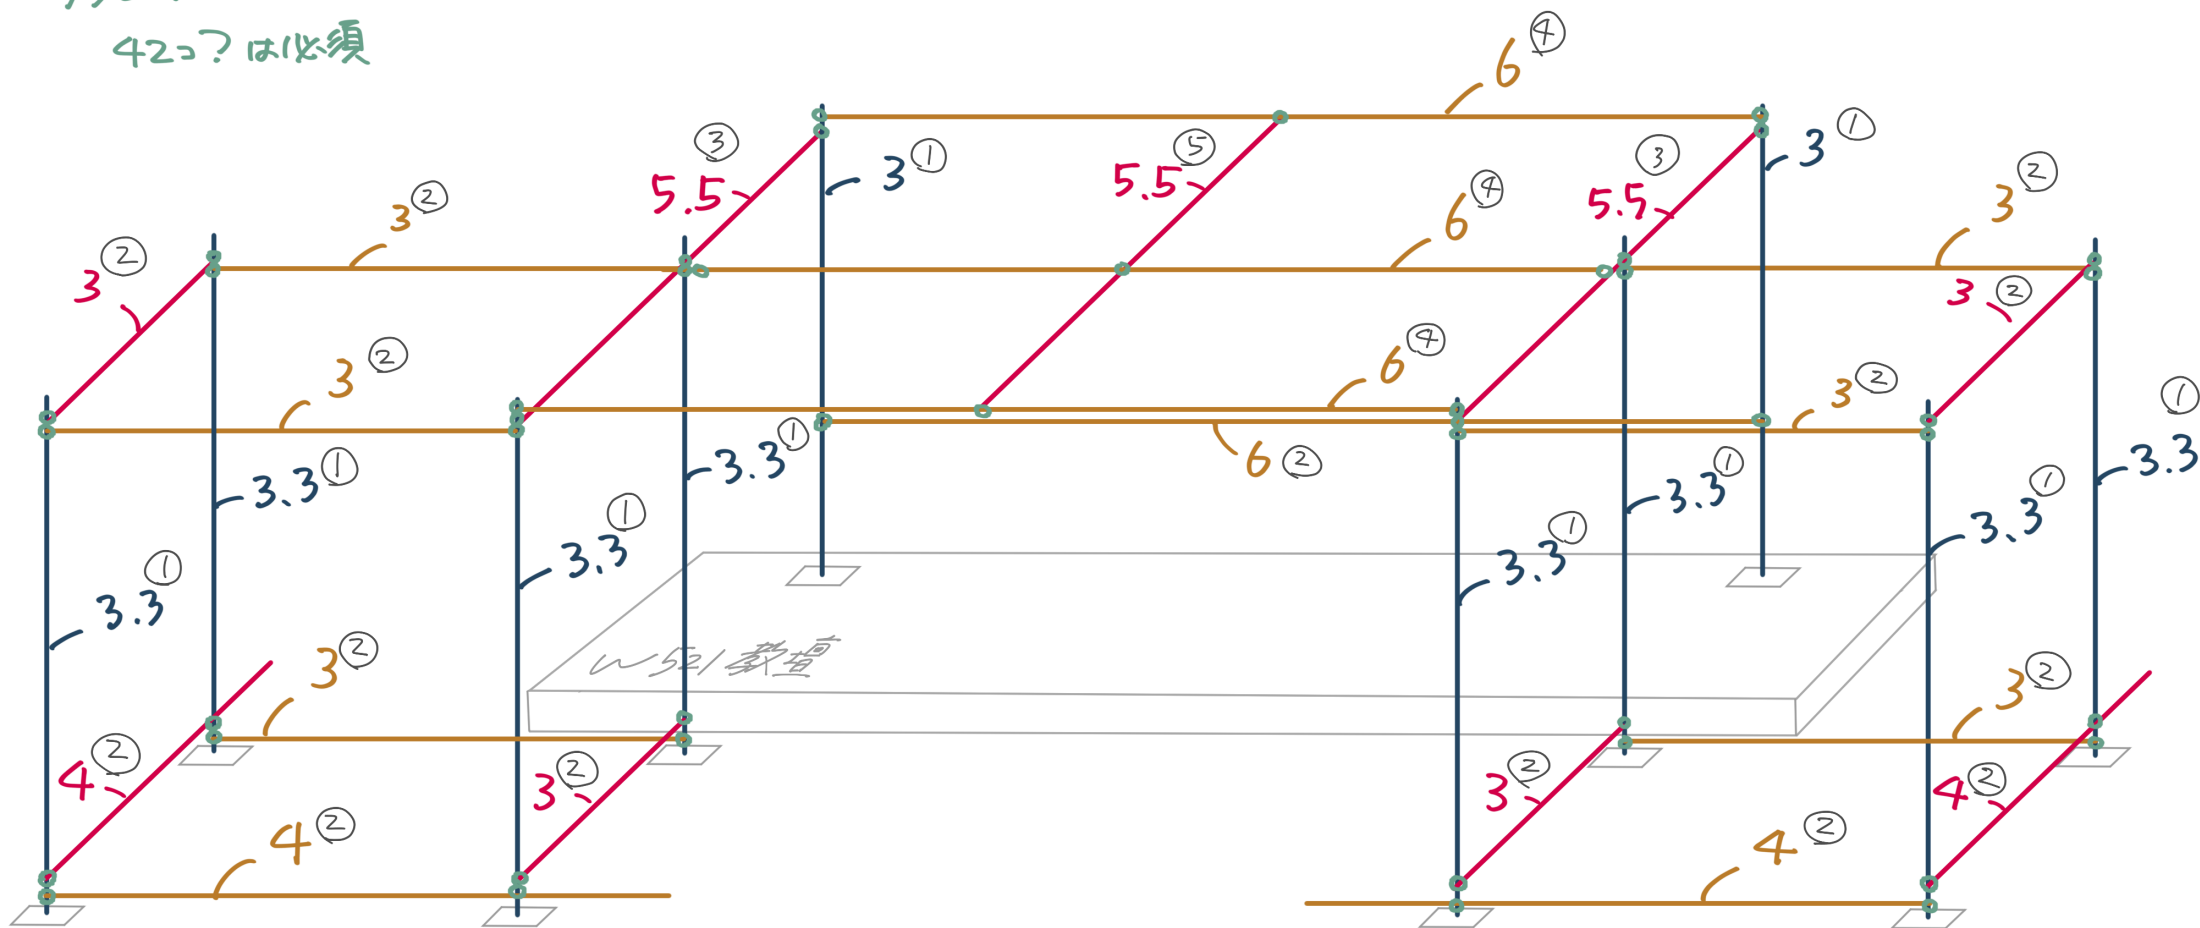

【パイプの組み方】

- ①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる
 - ②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む
 - ③ボックスの5.5mを通す
 - ④両ボックスを6mで繋ぐ
 - ⑤残りの中心の5.5を通す
- …クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用
