

○タイスケ

10月7日		仮仕込み								
	山内	芳澤	中嶋	相田	小磯	藤居	斎藤	藤田	川端	
~8:00		8:00 W521集合							8:00 部室集合	
8:00		103運び込み			12号運び込み				部室運び込み①	
8:30										
9:00		素舞台								
9:30		パイプ								
10:00										
10:30										
11:00										
11:30										
12:00										
12:30		部室運び込み②								
13:00										
13:30	W521集合	休憩								
14:00										
14:30	パンチ				明かりつぶし					
15:00	灯体設営				照明配線					
15:30										
16:00	照明確認									
16:30										
17:00										
17:30										
18:00	バラシ									
18:30										
19:00										
19:30										
~20:00	W521撤収									

午前→早めにパイプ終わらせたい！

- ・部室運び込みを2回に分ける
- ・部室①は、パイプ組みに必要なものと小物類だけ
- ・部室①終わったら12号(銀リヤ供給)
- ・新入部員は素舞台覚える
- ・パイプの1つ目のボックスは慣れてるひとがラチェット
- ・パイプが押した場合は、14:30-15:00のパンチ・明かりつぶしを短縮/後回し/カット

午後→各自仕込みでも大体同じ仕事をやるので覚える+照明確認

- ・パンチ、明かりつぶし、灯体設営、配線初めてのひとは分かる人に教えてもらう

○運び込みリスト

部室①	個数
銀リヤ	1
体温計	1
アルコール	3
ウェットティッシュ	1
救急箱	1
軍手	1箱
折れ釘入れ☆	1
電動ドリル	3箱
工具箱	1
アル助	3
差金	3
メジャー☆	5
水平さん	1
ラチェット	1
ヘルメット	1
クランプ	2箱
のこぎり	1冊
はさみ☆	3
カッター	1箱
マジック	1ケース
黒ガム	10
養生	10
両面	2
蓄光	1袋
パンチ	2
釘(65)☆	1箱
ビス(51,65,75)	1箱ずつ
ゴミ袋(青、白、黄)	1袋ずつ
カーテンフック☆	1袋
クリップ☆	1袋&1箱
安全ピン☆	1箱
ドライバー☆	1缶
ペンチ☆	8

部室②	
銀リヤ	1
DF(01, 11, 05, 07, 06, 09)	4
T1(01,02)	2
SUS4	1
座布団	(灯体用)
照明ビューター	1
変換	あるだけ
二又	あるだけ
延長	あるだけ
平行延長	あるだけ
ゼラファイル	3
ゼラケース	1
ハンガー	1箱
遮光シート	1袋
ボックス(大道具)	1
掃除機	1


12号倉庫	個数
台車	2
端	2
A	7
平台	7
片足	6
前	2
パイプ1m	4
パイプ2.8m	2
パイプ3m	10
パイプ3.3m	8
パイプ4m	4
103倉庫	
脚立	7
パイプ5.5m	4
パイプ6m	6
ジャッキ	10

12号先発	
端	2
A	7
平台	7
片足	6
前	2
12号抑え	
パイプ1m	4
パイプ2.8m	2
パイプ3m	10
パイプ3.3m	8
パイプ4m	4


注意事項

- ・銀リヤは部室運び込み①が終わったら中庭に持っていきましょう
- ・台車、銀リヤは531前に置いておきましょう
- ・部室②は銀リヤを持って部室へ行きましょう
- ・クランプは共有スペースの柱の後ろにあります
- ・☆つけたものは入って右の棚中段にあるプラスチックのケースに入ってます
- ・クリップの箱には安全ピンも入ってますが、安全ピン1箱はそれと別にあるってことです
- ・ペンチはあまり種類気にせずケースごと持ってきてください

○舞台設計図

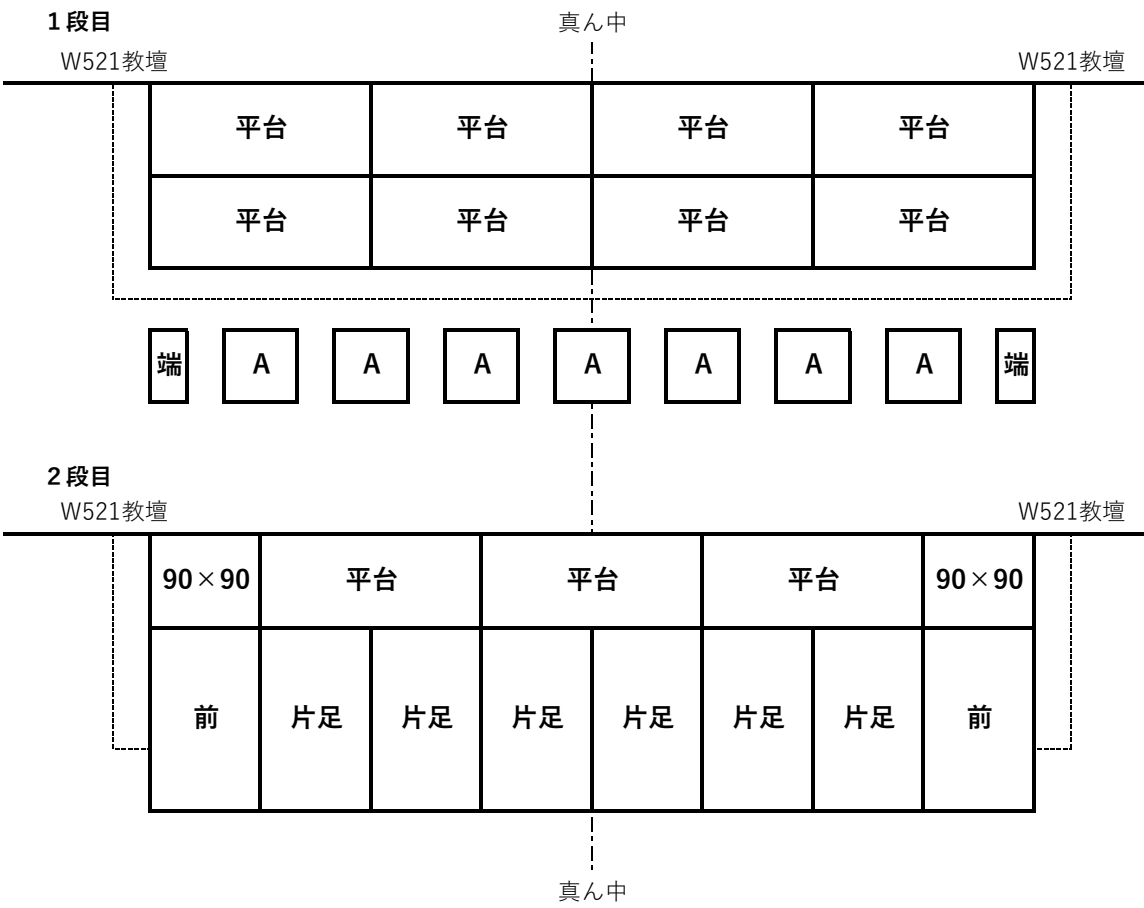

クランプ
42mmは必須

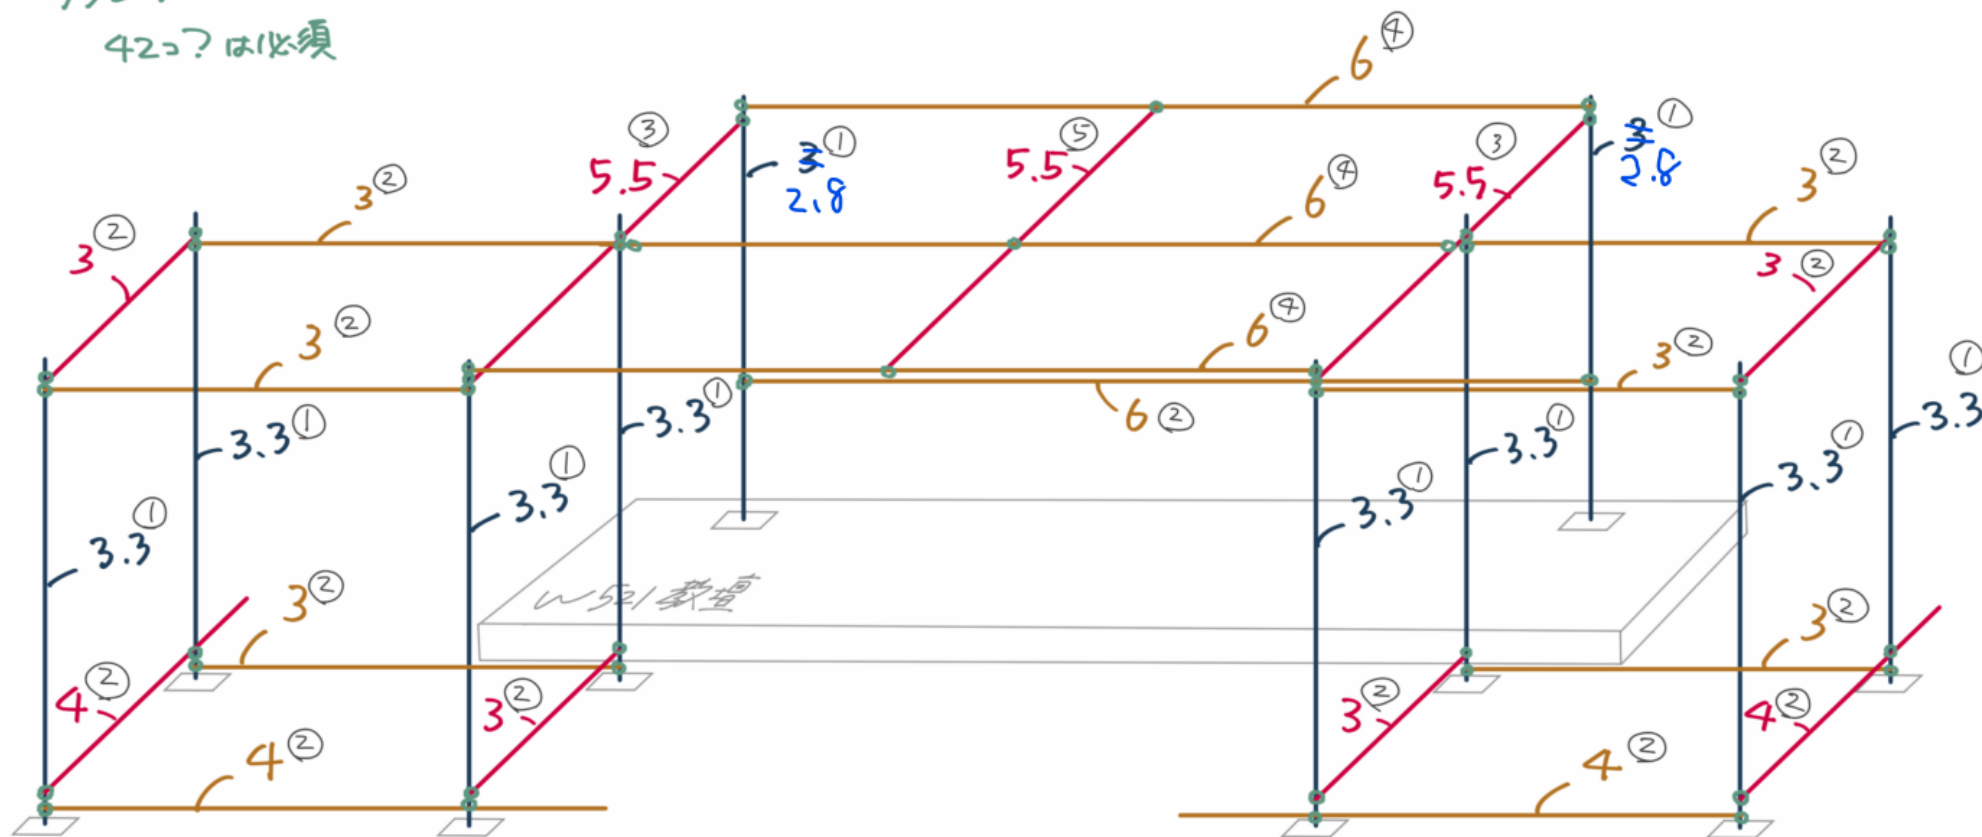

【パイプの組み方】

- ①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる
 - ②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む
 - ③ボックスの5.5mを通す
 - ④両ボックスを6mで繋ぐ
 - ⑤残りの中心の5.5を通す
- …クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用
