

仮仕込み運び込みリスト10月6日(日)

部室①	個数
銀リヤ	1
台車	1
工具箱	1
アル助	3
差金	3
メジャー	あるだけ
水平さん	1箱
ラチェット	1箱
ヘルメット	1箱
固定クランプ	2箱
釘 (65)	1箱
養生	20
ウェットティッシュ	1
ゴミ袋 (青、白、黄)	1袋ずつ
ペンチ	あるだけ
ノコギリ	1冊
ハサミ	あるだけ
マジック	1ケース
番線	2袋
両面	あるだけ
救急箱	1

部室②	個数
銀リヤ	2
台車	2
DF (01 11 05 07 06 09)	6
T1 (12 02 01)	3
スタンド	3
ハンガー	1箱
座布団(灯体)	1カゴ
調光卓	1
ピューター	3
変換	1袋
二又	1袋
延長	1袋
平行延長	4袋
ゼラファイル	2
ゼラケース	1ケース
暗幕	あるだけ
舞台美術	※
パンチ	※
安全ピン	2 箱
カーテンフック	1 箱&1袋
滑り止め	1袋
パネル	3

12号倉庫	個数
台車	2
銀リヤ	1
端	2
A	7
平台	11
片足	6
前	2
90×90	2
パイプ2.8m	2
パイプ3m	10
パイプ3.3m	8
パイプ4m	4
パネル	4
箱馬	8
58×33	2


103倉庫	個数
脚立	7
パイプ5.5m	3
パイプ6m	4
ジャッキ	10

12号倉庫に支援課から借りた銀リヤ1と台車2が保管されてます
 58*33の平台は分かりやすく置いておきます
 番線は部室横の倉庫1番下の段にあります
 パンチは灰色の90*720が2巻と90*540が1巻、90*90が1巻です
 舞台美術は部員が指示して運んでください
 ピューター3は運んで欲しいのを分かりやすく置いておきます
 パネルは諸事情でサークル棟下の共有スペースに2枚と部室横の倉庫に1枚あります

仮仕込みタイスケ10月6日(日)

	黒木	山内	斉藤	大澤	東崎	今川	水沼	古谷	武田
	WL1-201集合							部室集合	
9:00	103運び込み		12号倉庫運び込み					部室運び込み①	
9:30							素舞台		
10:00	パイプ								
10:30									
11:00									
11:30									
12:00									
12:30									
13:00									
13:30									
14:00	部室運び込み②								
14:30	花道・舞台美術		パンチ			パネル			
15:00			暗幕						
15:30	灯体設営				照明配線				
16:00									
16:30	照明確認								
17:00									
17:30									
18:00	バラシ								
18:30									
19:00									
19:30									
20:00	WL1-201撤収								

○舞台設計図

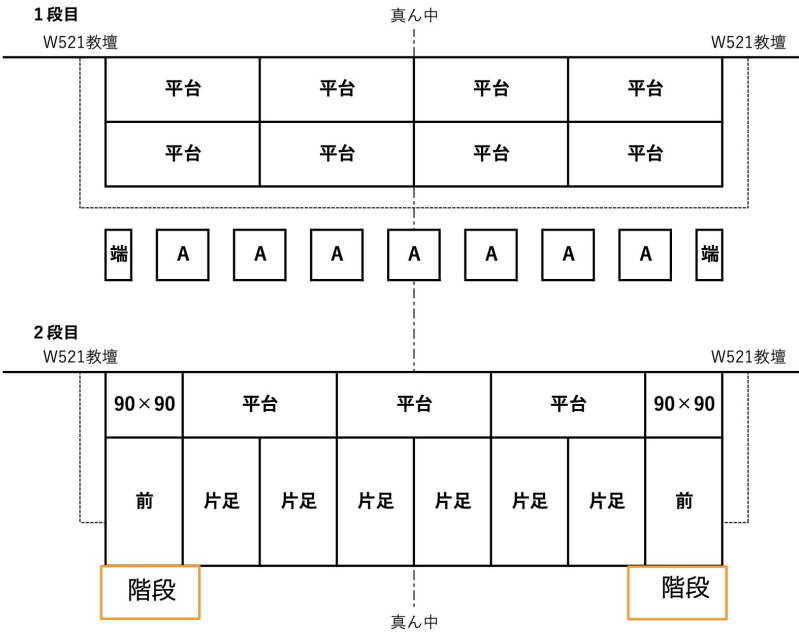


階段は箱馬とコンパネで作ります。



クランプ

420? は必須

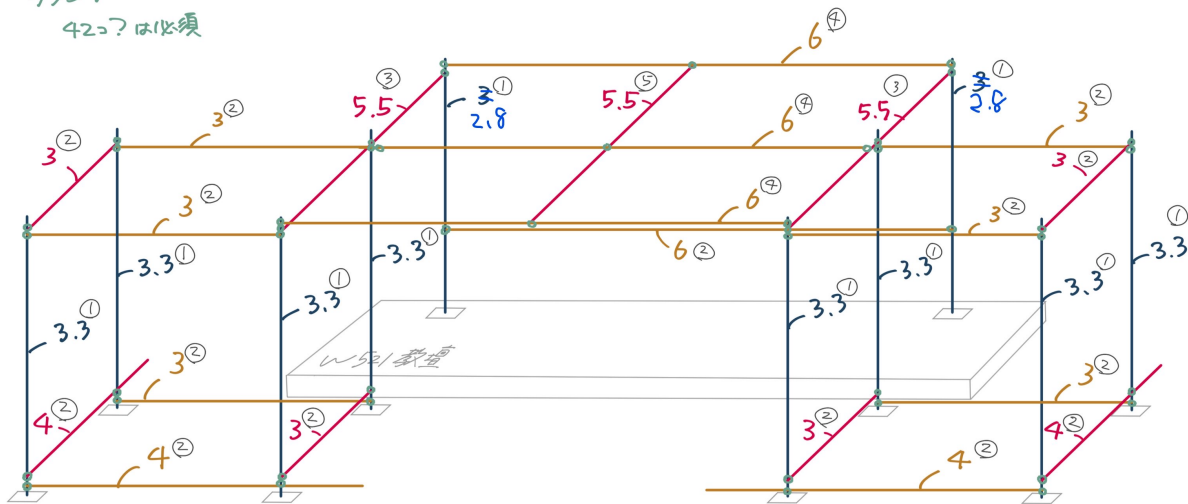


【パイプの組み方】

- ①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる
- ②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む
- ③ボックスの5.5mを通す
- ④両ボックスを6mで繋ぐ
- ⑤残りの中心の5.5を通す

…クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用

暗幕

暗幕はこの黒いインで
つけます。
(ハケはつくらない)

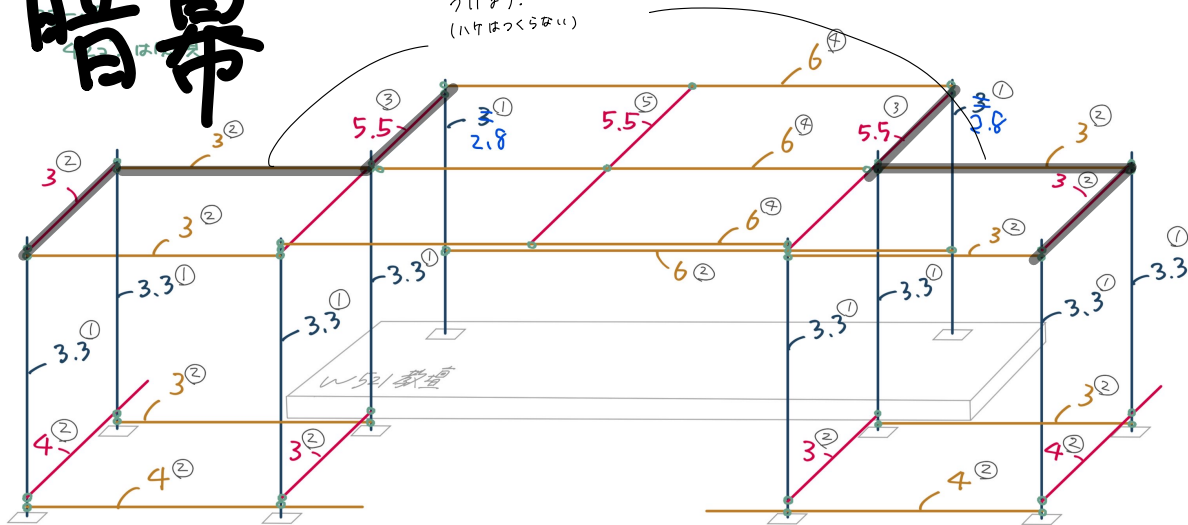


【パイプの組み方】

- ①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる
- ②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む
- ③ボックスの5.5mを通す
- ④両ボックスを6mで繋ぐ
- ⑤残りの中心の5.5を通す

…クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用

かりこみ

42=2は必須

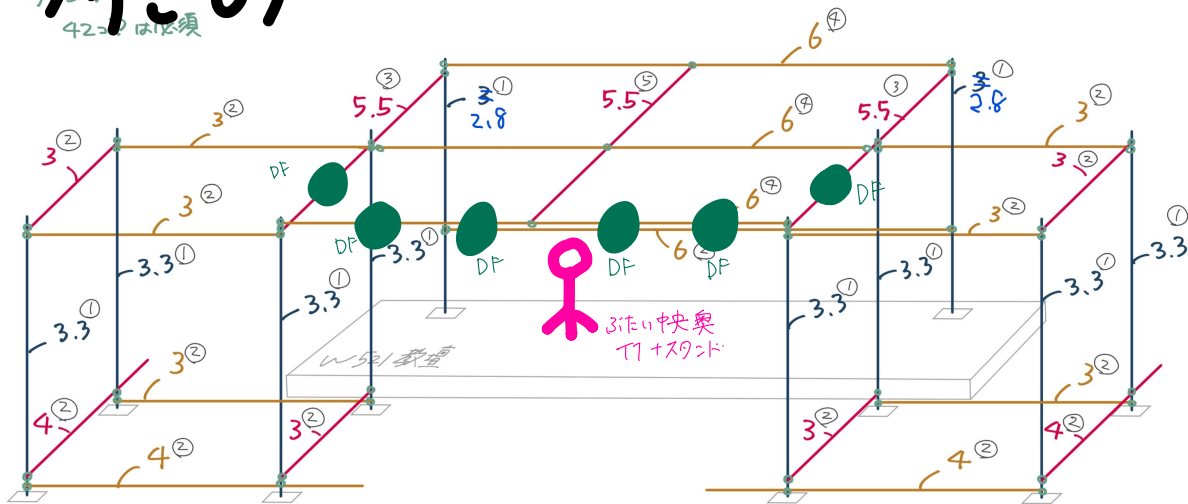

下の机

①ジャッキ(パイプ立てる用の足)、縦のパイプを並べる

②両脇のボックス(状になってるパイプ)の横パイプを下から順に組む

③ボックスの5.5mを通す

④両ボックスを6mで繋ぐ

⑤残りの中心の5.5を通す

クランプ(ネジ付きの金属の固定具)をラチェット(ネジを固める工具)で固定
水平垂直に固定することで安定→水平さん(水泡が入った磁石)使用

上の机

T1+スタンズ
